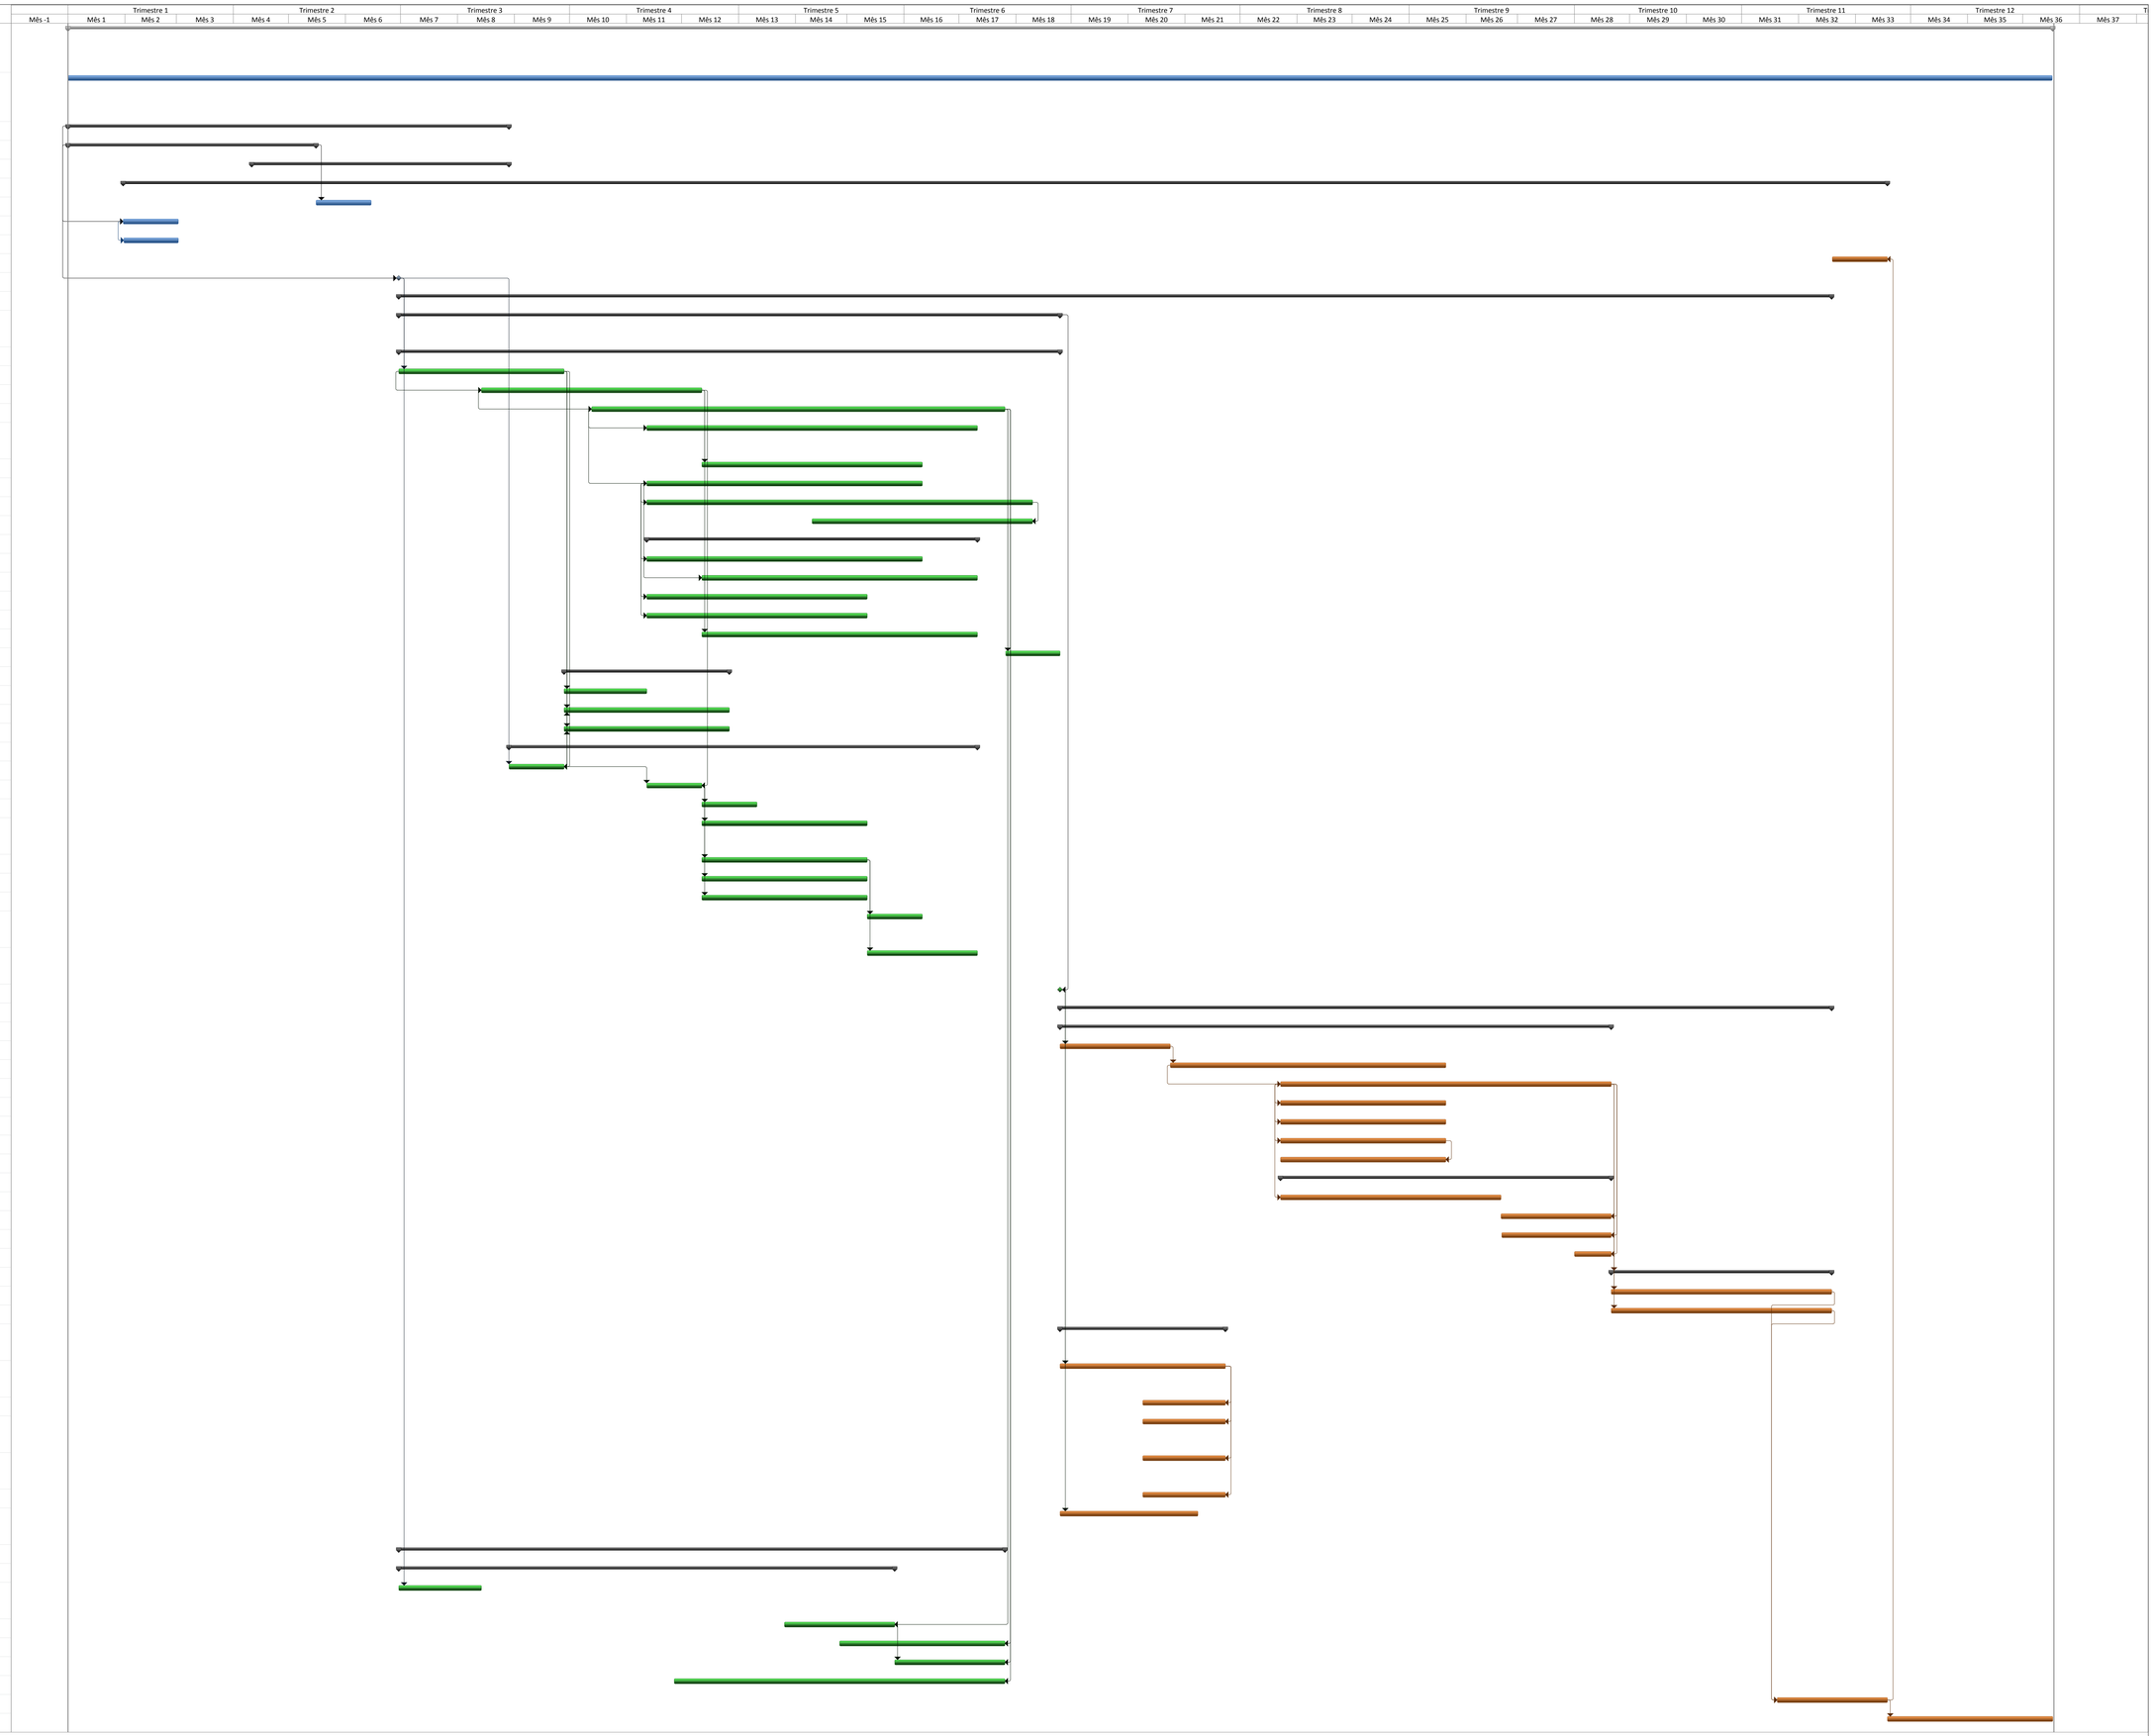Id	Nome da tarefa	Duração
0	**Projeto Básico, Projeto Executivo e Obras de Reforma e Ampliação do TPS de SBCT**	**1080 dias**
1	Serviços Técnicos de Gerenciamento do Projeto de Reforma e Ampliação do TPS de SBCT	1080 diasd
2	**Projetos de Engenharia da Reforma e Ampliação do TPS de SBCT**	**240 dias**
3	**Projeto Básico de Reforma e Ampliação do TPS de SBCT**	**135 dias**
19	**Projeto Executivo de Reforma e Ampliação do TPS de SBCT**	**140 dias**
83	**Serviços Iniciais da Obra**	**960 dias**
84	Demolições das Edificações Externas	30 diasd
85	Instalação do Canteiro de Obras	30 diasd
86	Mobilização de Mão-de-obra e Equipamentos	30 dias
87	Desmobilização Mão-de-obra e Equipamentos	30 dias
88	**Término - Etapa 1**	**0 dias**
89	**Obras de Ampliação do TPS de SBCT**	**780 dias**
90	**1ª Ampliação do TPS de SBCT - a partir do Eixo C/115 em Direção ao Eixo I (Todos os Pavimentos) - Figura 53 (COPA 2014)**	**360 dias**
91	**1ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 2) - Corpo Central do TPS e Concours**	**360 dias**
92	Fundações da 1ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 2)	90 diasd
93	Estruturas da 1ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 2)	120 diasd
94	Arquitetura 1ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 2)	225 diasd
95	Instalações Hidrossanitárias, Combate à Incêndio e Gás Combustível da 1ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 2)	180 diasd
96	Infraestrutura Sanitária da 1ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 2)	120 diasd
97	Sistema Elétrico da 1ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 2)	150 diasd
98	Sistemas Eletrônicos da 1ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 2)	210 diasd
99	Rede de Telemática da 1ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 2)	120 diasd
100	**Sistemas Mecânicos da 1ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 2)**	**180 dias**
101	Sistema de Ar Condicionado Central e Ventilação Forçada da 1ª Ampl	150 diasd
102	Esteiras Transportadoras de Bagagem da 1ª Ampliação do TPS de SB	150 diasd
103	Elevadores da 1ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 2)	120 diasd
104	Escadas Rolantes da 1ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 2)	120 diasd
105	Pontes de Embarque da 1ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 2)	150 diasd
106	Serviços Complementares da 1ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 2)	30 dias
107	**Infraestrutura da 1ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 2)**	**90 dias**
108	Vias de Serviço da 1ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 2)	45 diasd
109	Via de Retirada de Lixo / Acesso Sudeste	90 diasd
110	Estacionamento Operacional Sudeste	90 diasd
111	**Nova Central de Utilidades (CUT)**	**255 dias**
112	Fundações da Nova Central de Utilidades (CUT)	30 diasd
113	Estruturas da Nova Central de Utilidades (CUT)	30 diasd
114	Arquitetura da Nova Central de Utilidades (CUT)	30 diasd
115	Instalações Hidrossanitárias, Combate à Incêndio e Gás Combustível da Nova Central de Utilidades (CUT)	90 diasd
116	Sistema Elétrico da Nova Central de Utilidades (CUT)	90 diasd
117	Sistemas Eletrônicos da Nova Central de Utilidades (CUT)	90 diasd
118	Rede de Telemática da Nova Central de Utilidades (CUT)	90 diasd
119	Equipamentos da Subestação de Energia da Nova Central de Utilidades (CUT)	30 diasd
120	Equipamentos do Sistema Central de Ar condicionado da Nova Central de Utilidades (CUT)	60 diasd
121	**Término - Etapa 2**	**0 dias**
122	**2ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 3)**	**420 dias**
123	**2ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 3) - Corpo Central do TPS e Passarel**	**300 dias**
124	Fundações da 2ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 3)	60 diasd
125	Estruturas da 2ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 3)	150 diasd
126	Arquitetura da 2ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 3)	180 diasd
127	Instalações Hidrossanitárias, Combate à Incêndio e Gás Combustível da	90 diasd
128	Sistema Elétrico da 2ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 3)	90 diasd
129	Sistemas Eletrônicos da 2ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 3)	90 diasd
130	Rede de Telemática da 2ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 3)	90 diasd
131	**Sistemas Mecânicos da 2ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 3)**	**180 dias**
132	Sistema de Ar condicionado Central da 2ª Ampliação do TPS de SBCT	120 diasd
133	Elevadores da 2ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 3)	60 diasd
134	Escadas Rolantes da 2ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 3)	60 dias
135	Esteiras Rolantes (Externas) da 2ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 3	20 diasd
136	**Infraestrutura da 2ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 3)**	**120 dias**
137	Ampliação do Sistema Viário de Acesso ao Embarque e Desembarque	120 diasd
138	Estacionamento de Carga e Descarga de Materiais	120 diasd
139	**Acabamentos do 3o Pavimento das Áreas da 1ª Ampliação do TPS de SCBT (Etapa 3)**	**90 dias**
140	Arquitetura dos Acabamentos do 3o Pavimento da 1ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 3)	90 diasd
141	Instalações Hidrossanitárias, Combate à Incêndio e Gás Combustível do	45 diasd
142	Sistema Elétrico do 3o Pavimento da 1ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 3)	45 diasd
143	Sistemas Eletrônicos do 3o Pavimento da 1ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 3)	45 diasd
144	Rede de Telemática do 3o Pavimento da 1ª Ampliação do TPS de SBCT (	45 diasd
145	Sistema de Ar Condicionado Central e Ventilação Forçada do 3o Pavimento da 1ª Ampliação do TPS de SBCT (Etapa 3)	75 diasd
146	**Obras de Reforma do TPS Existente de SBCT**	**330 dias**
147	**Reforma dos Elevadores do TPS Existente de SBCT**	**270 dias**
148	Substituição dos Elevadores Hidraulicos do Saguão e Instalação de Novo Elevador.	45 diasd
149	Elevadores de Acessibilidade na Área Internacional	60 diasd
150	Reforma do Concourse / Salas de Embarque	90 diasd
151	Reforma da Nova Área Alfandegada de Desembarque	60 diasd
152	Reforma das Demais Áreas do TPS Existente de SBCT	180 diasd
153	Projetos "as built" da Reforma e Ampliação do TPS de SBCT	60 diasd
154	**Recebimento Definitivo da Reforma e Ampliação do TPS de SBCT**	**90 diasd**
